

別紙様式1

工事中標示板

2cm	110cm	2cm
140cm		12cm 43cm 35cm 11cm 35cm 2cm
ご協力をお願いします		
〇〇〇〇のため〇〇 〇〇を行っています。		
上三川町大字〇〇〇地内		
平成〇年〇月〇日まで 時間帯〇:〇〇~〇:〇〇		
〇〇〇〇工事		
発注者	上三川町 〇〇〇〇課 〇〇係	
	電話0285-56-0000	
施工者	〇〇〇建設株式会社 請負額0,000万円	
	電話000-000-0000	

備考

(1) 色彩は、「ご協力をお願いします」等の挨拶文、「〇〇〇〇工事」等の工事種別については、青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇のため〇〇〇〇を行っています」等の工事内容等、工事期間、時間帯については青文字、その他の文字及び線は黒色とし、下地は白色とする。

(2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。

まわり道標示板



備考

- (1) 色彩は、矢印、起終点の記号、通行止区間を赤色、その他の文字、記号、地図、迂回路を青色、下地を白色とする。
- (2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。



参考(1) 工事種別と工事内容の記載例

- ・工事内容は、下表を参考として概ね20字以内で簡潔に記載すること
- ・工事内容中のカッコ書きについては、何れか一方を記載すること

分類	工事種別	工事内容
道路関係	道路(改築・舗装)工事	利便性向上のため道路を新設します
		走行性向上のため道路を拡幅します
		渋滞を解消するためバイパスを整備します
	交差点改良工事	渋滞を緩和するため交差点を改良します
		交通事故対策のため交差点を改良します
		事故の危険性を解消するため交差点を改良します
	歩道整備工事	歩行者の安全確保のため歩道を整備します
	橋梁工事	新しく橋を(架け・架け替え)ます
	道路標識工事	地名や路線名の案内標識を設置します
	道路照明工事	安全を確保するためカーブを明るくします
		安全な通行を確保するため道路照明を整備します
	舗装修繕工事	走行性向上のため傷んだ舗装をなおしています
		車道の(低騒音・排水性)舗装を行います
法面保護工事	落石を防ぐため防護ネットを設置します	
橋梁補強工事	地震対策のため橋の補強を行っています	
共同溝工事	災害からライフラインを守るため共同溝工事をします	
歩道橋新設工事	歩行者の安全確保のため歩道橋を新設します	
河川関係	護岸工事	堤防・法面保護のために護岸を整備します
	橋梁工事	河川(改修・拡幅)のために橋を架け替えます
	堰改築工事	河川(改修・拡幅)のために堰を改築します
	樋管改築工事	河川(改修・拡幅)のために樋管を改築します
	災害復旧工事	河岸崩壊のため護岸を整備します
	護床工事	洗掘防止のために護床を整備します
	築堤工事	洪水氾濫を防止するために堤防を整備します
	堤防天端舗装工事	堤防の性能向上のために舗装をします
	ダム本体工事	水害防除と水質確保のためダムを整備します
	堰提改良工事	既存ダムの機能増進のためダムを改築します
	堆積土除去工事	河積を確保するために土砂を取り除きます
	堤防除草工事	堤防の維持管理を図るため除草します
	砂防関係	急傾斜地崩壊対策工事
砂防工事		土石流に備え(砂防堰堤・護岸)を整備します
地すべり対策工事		地すべりを防ぐための対策工事を行います
雪崩対策工事		雪崩から人家を守るため(擁壁・防止柵)を整備します
街路関係	交通結節点整備工事	駅へのアクセス道路を整備します
	歴史の街並み整備工事	歴史のある地区の古い街並みを創出します
	立体交差工事	交通渋滞を防ぐため道路を立体交差にします
	シンボル道路整備工事	美しい街並み景観を創出する道をつくります
公園関係	駐車場整備工事	来園者用駐車場を整備します
	施設整備工事	休憩場を造っています
		トイレを造っています
下水道関係	管路工事	よごれた水を処理場まで運ぶ管を整備します
	雨水管路工事	大雨時の浸水を防ぐため管を整備します
	処理場工事	よごれた水をきれいにする施設を整備します

区分	工事種別	工事内容
電気関係	電気工事	電気設備の(新設・取替・撤去)を行っています
		電気設備の移設を行っています
		埋設物の調査を行っています
		電気設備の緊急修理を行っています
		電気設備の機材を(入れて・出して)います
		電気設備の点検・修理を行っています
		電柱の撤去を行っています
		電気設備の埋設跡の復旧を行っています
電話関係	電話工事	電話設備の(新設・取替・撤去)を行っています
		電話設備の敷設を行っています
		埋設物の調査を行っています
		電話設備の緊急修理を行っています
		電話設備の機材を(入れて・出して)います
		電話設備の点検・修理を行っています
		電柱の撤去を行っています
		電話設備の埋設跡の復旧を行っています 公衆電話BOXの(新設・撤去)を行っています
ガス関係	ガス工事	ガス管の(新設・取替・撤去)を行っています
		ガス管の修理を行っています
		ガス管の移設を行っています
		埋設物の調査を行っています
		ガス漏れのため緊急修理を行っています
		ガス管の点検・修理を行っています
		ガス管の埋設跡の復旧を行っています
水道関係	水道工事	水道管の(新設・取替・撤去)を行っています
		水道管の修理を行っています
		水道管の移設を行っています
		埋設物の調査を行っています
		緊急で水道管の水漏れを直しています
		水道管の点検・修理を行っています
		水道管の埋設跡の復旧を行っています
下水道関係	下水道工事	下水道管の(新設・取替・撤去)を行っています
		下水道管の(浸水対策・耐震化)を行っています
		下水道管の修理を行っています
		下水道管の移設を行っています
		埋設物の調査を行っています
		下水道管の緊急修理を行っています
		下水道管の点検・修理を行っています 下水道管の埋設跡の復旧を行っています

参考(2) 車線の一部が工事中の場合の標示例

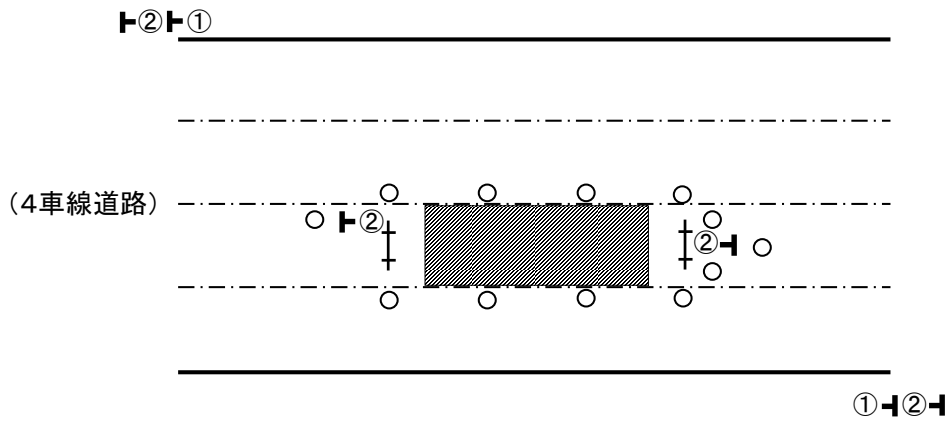

凡 例	
	バリケード
	工事標識、看板
	赤ランプ又は標柱

必要があれば設置する道路注意標識




①その他の危険看板



②道路工事中看板

参考(3) 工事中迂回路の標示例(市街部の場合)
(進行方向に対する標識の設置例を示す)

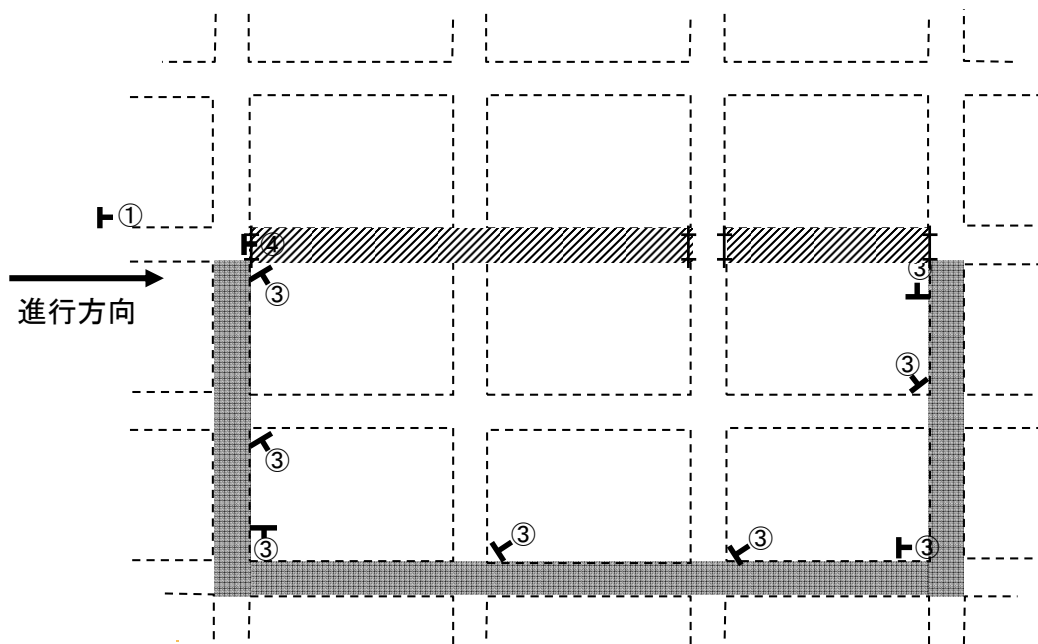

①その他の危険看板



③まわり道看板

凡 例	
	工事区間
	迂回路
	バリケード
	工事標識、看板

ご協力をお願いします

〇〇〇〇のため〇〇
〇〇を行っています。

上三川町大字〇〇〇地区内

平成〇年〇月〇日まで
時間帯〇:〇〇~〇:〇〇

〇〇〇〇工事

※注意 上三川町 〇〇〇〇番 〇〇〇番
電話0285-56-0000

施工者 〇〇〇建設株式会社 建設部 〇〇〇〇部
電話0285-560-0000

まわり道300m


100m先〇〇工事につき
まわり道をお避り下さい

※ 期:〇月〇日~〇月〇日・終日
時間帯:〇:〇〇~〇:〇〇

上三川町〇〇〇〇番〇〇〇番
電話0285-56-0000

④通行止区間看板

参考(4) 工事中迂回路の標示例(地方部における道路工事の場合)
(進行方向に対する標識の設置例を示す)

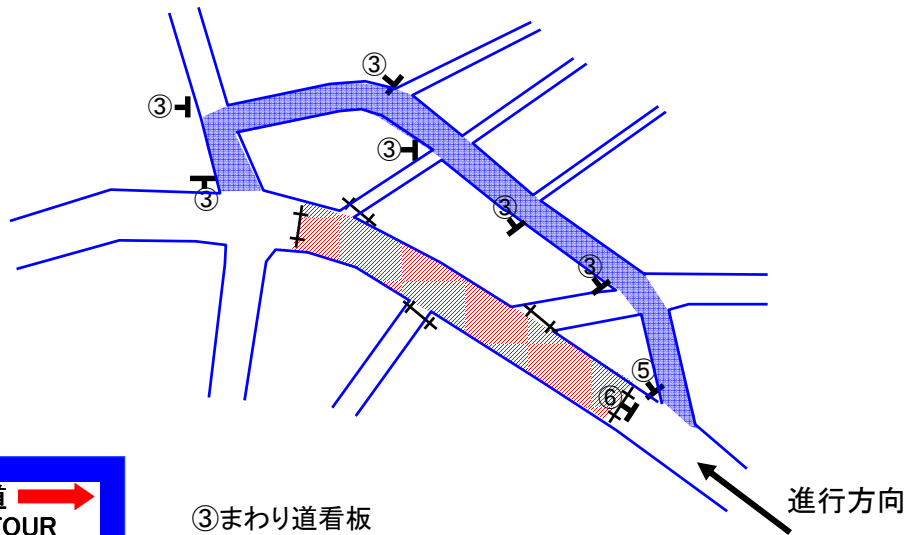

③まわり道看板




⑤まわり道標示板

凡 例	
	工事区間
	迂回路
	バリケード
	工事標識、看板



⑥通行止区間看板

参考(5) リサイクル材料使用工事現場看板

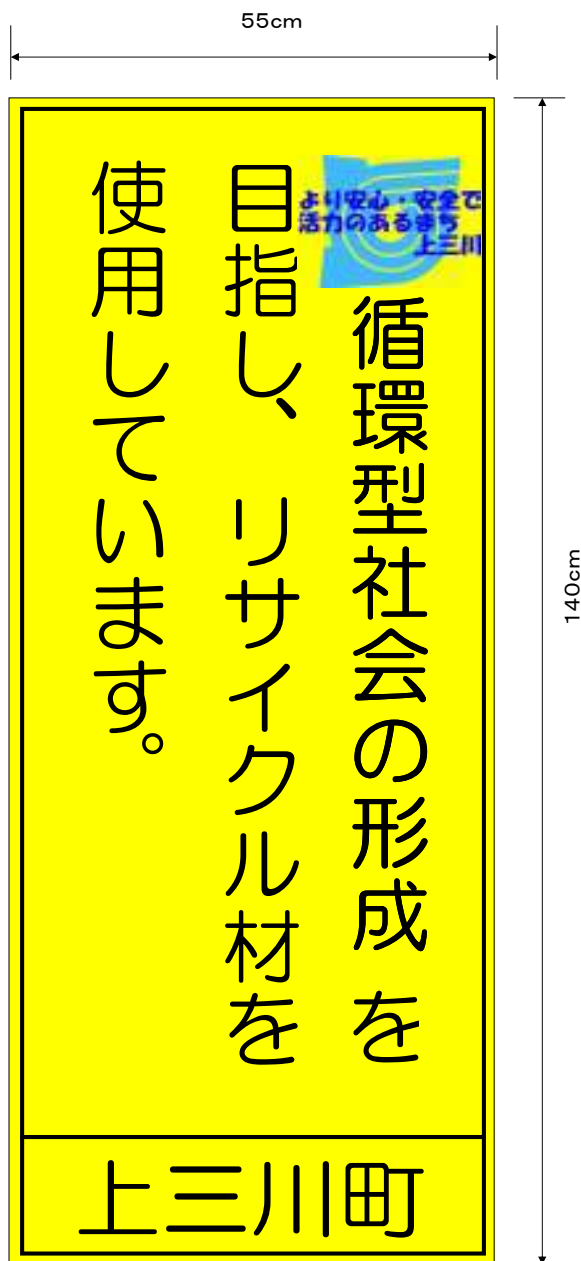

備考

- (1) リサイクル材料とは、再生資源のうち再生資源化施設等で製造されて再生利用できる資材である。
- (2) 色彩は、文字、記号を黒色、下地を黄色とする。

参考(6) その他の工事標示板



工事予告標示板
140cm × 55cm



速度落とせ標示板
140cm × 55cm



停止位置標示板
140cm × 55cm



車線減標示板(1)
140cm × 55cm



車線減標示板(2)
140cm × 55cm




段差注意標示板
140cm × 55cm



相互通行標示板
140cm × 55cm



工事区間終り標示板
140cm × 55cm





歩行者通路標示板
140cm × 55cm

備 考

- (1) 色彩は、文字、記号を黒色、下地を橙色とする。
- (2) 上に示す標示板以外の標示板の設置が必要な場合は、これに準拠した図柄を使用する。

参考(7) 補助ステッカー

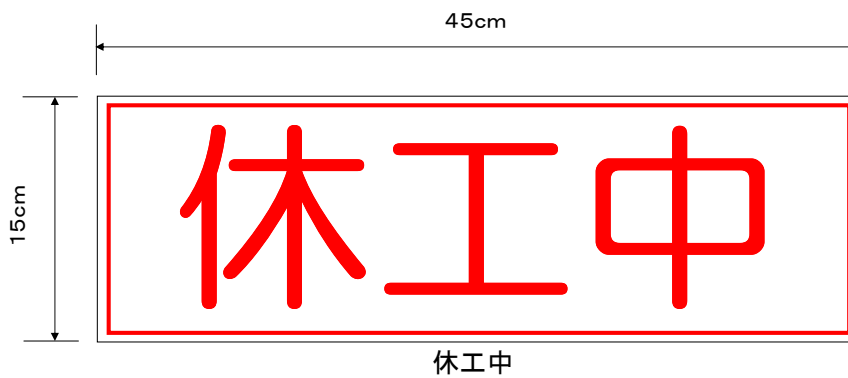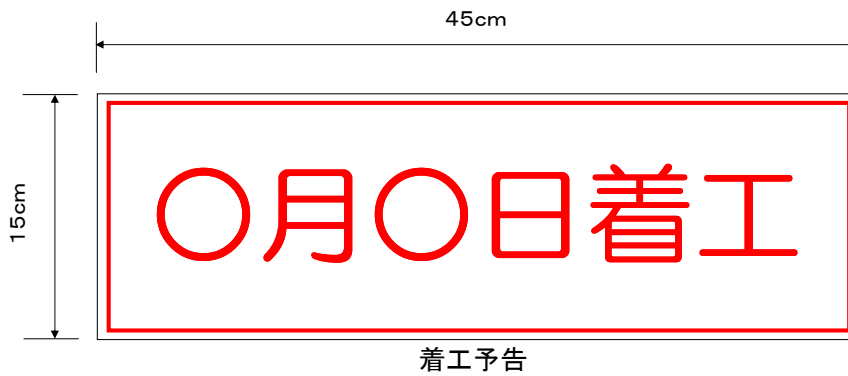

備考

(1) 色彩は、文字、外枠を赤字、下地を白色とする。

参考(8) 標示板設置方法の一例

